



Depto. Leg. 10

OF. GABPREF Nº 244/17

Belo Horizonte, 15 / 12 / 2017

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 1300/2017** – Vereador Pedro Patrus – encaminhado pelo ofício Of. DIRLEG Nº 4.821/17, de 20/10/17.

Senhor Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 1.300/2017, de autoria do Vereador Pedro Patrus, com pedido de informação sobre a obra que está sendo feita na Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre as ruas Uruguai e Montes Claros. 1 - O cronograma Físico-Financeiro da obra, composto das informações sobre o aporte financeiro recebido pelo órgão público, o gasto já efetuado e quanto ainda está previsto. 2 - Qual o estágio atual que a obra se encontra. 3 - O contrato firmado com a empresa responsável pela obra. 4 - A previsão de término da obra.

Consultada, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital emitiu resposta por meio do Relatório Informativo, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Caio Barros Cordeiro

Diretor Técnico-Legislativo em exercício
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE BHTE 18/DEZ/2017 10:22 000009980

DIR-Diret. Legislativa-18-Dez-2017-11:00-00831-1/1

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
Vereador Henrique Braga
CAPITAL

AVULSOS DISTRIBUÍDOS
Em 18 / 12 / 17
GA - CM65
Responsável pela distribuição

RELATÓRIO INFORMATIVO

Empreendimento: Execução dos serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto das galerias do Córrego do Acaba Mundo

Contrato: AJ-011/15

De: Engº Luiz Arnaldo Junqueira Prata

Para: Engº: Renato Gonçalves de Mello Júnior

Ref: **RELATÓRIO INFORMATIVO – RECUPERAÇÃO DA GALERIA DO CÓRREGO DO ACABA MUNDO**

Prezado Senhor,

Atendendo às solicitações contidas no ofício DIRLEG Nº 4.821/17, encaminho-lhe as seguintes informações:

1 – O contrato de execução dos serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto da galeria do córrego do Acaba Mundo, tem término previsto no dia 09/12/17. Porém, devido o início do período chuvoso, e a não possibilidade de se trabalhar durante as chuvas, solicitou-se o aditivo de 180 dias ao contrato. Contudo, espera-se que as atividades sejam concluídas antecipadamente, conforme cronograma em anexo.

Os valores pagos e previstos para desembolso até o término da obra se encontram no cronograma financeiro em anexo.


2 – A obra se encontra com aproximadamente 74% das atividades concluídas.

3 – O contrato referente às atividades em questão, é o AJ-011/15, o qual tem como detentora a Construtora G-MAIA LTDA. O código do empreendimento é DV-S-MAN-14-1760, e o número da licitação é SCO - 045/2014.

4 – O término previsto após a publicação do pedido de aditivo de prazo solicitado será em 07/06/2018. Porém, as atividades podem ser concluídas antecipadamente, dependendo das condições climáticas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, porventura necessários.


Atenciosamente.


Engº Luiz Arnaldo Junqueira Prata
Supervisão de Obras
DVMDR/SD


Lucas Félix de Oliveira Dias Silva
Técnico
DVMDR/SD

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Meses	REALIZADO				PREVISTO			
	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18
Valores	R\$ 614.619,74	R\$ 1.098.409,31	R\$ 689.076,60	R\$ 645.660,54	R\$ 324.876,56	R\$ 388.455,97	R\$ 188.910,00	R\$ 185.258,42
Valor Acumulado	R\$ 614.619,74	R\$ 1.713.029,05	R\$ 2.402.105,65	R\$ 3.047.766,19	R\$ 3.372.642,75	R\$ 3.761.098,72	R\$ 3.950.008,72	R\$ 4.135.267,14

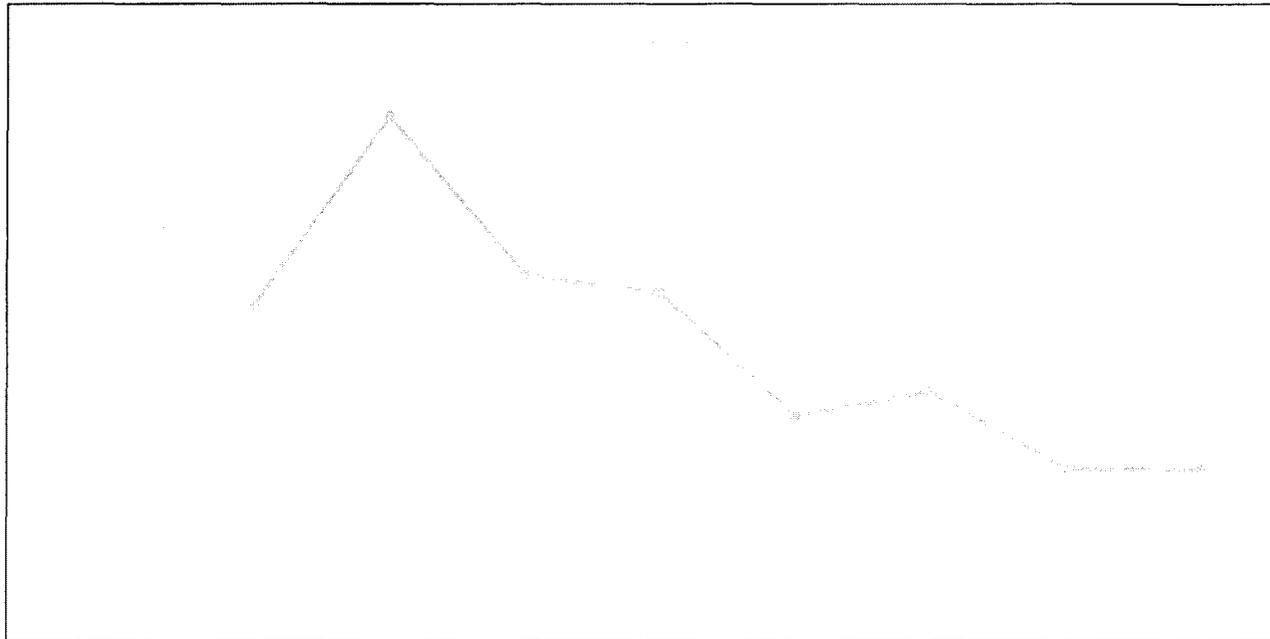

SUDECAP - ACABA MUNDO

ID	Task Mode	Nome da Tarefa	Start	Finish	June	July	August	September	October	November	December	January	February
					M	E	B	M	E	B	M	E	B
1		PROJETO SUDECAP - ACABA MUNDO	Mon 26/06/17	Thu 15/02/18									
2		AV. URUGUAI - 60,0 m	Sat 25/11/17	Wed 06/12/17									
8		AV. N. SRA. DO CARMO - 785,2 m	Mon 17/07/17	Fri 17/11/17									
66		AV. DO CONTORNO - 122,00m	Wed 11/10/17	Wed 01/11/17									
78		R. PROF. MORAIS - 200,30	Mon 30/10/17	Mon 30/10/17									
84		R. TOMÉ DE SOUZA - 142,00	Wed 11/10/17	Thu 23/11/17									
97		R. RIO GRANDE DO NORTE - 626,5	Wed 11/10/17	Fri 29/12/17									
140		AV. AFONSO PENA	Tue 12/09/17	Tue 23/01/18									
148		PARQUE MUNICIPAL	Mon 26/06/17	Thu 15/02/18									

Projeto: 200622_cron_rev1 Data: Wed 08/11/17	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término		
